



Lab 2: 项目计划与原型设计



实验目标

- 根据项目需求建立用户故事清单，使用敏捷开发方法为用户故事建模卡片，规划优先级，估计工作量，构思迭代计划；
 - 练习使用CodeArts或其他自选的Scrum项目管理工具为项目建立迭代计划；
 - 练习使用大模型设计软件原型；
 - 练习使用MockPlus或其他自选的原型设计工具为每个用户故事设计软件原型。
-
- 本次实验以Project分组为单位。

实验步骤

- 针对小组拟完成的Project，完成以下任务：
 - 根据讨论纪要，提取形成用户故事清单；
 - 为每个用户故事形成卡片；
 - 分析用户故事的优先级；
 - 组内成员采用表决和投票的方式，估算各用户故事的工作量；
 - 根据以上结果，设计项目的迭代开发计划；
 - 使用CodeArts或其他自选的Scrum项目管理工具建立和管理迭代计划；
 - 选取一个用户故事，使用大模型进行原型设计；
 - 使用MockPlus或其他自选的原型设计工具对关键的用户故事进行原型设计(GUI)；——注：此处应至少包含5个用户故事的原型设计，且均为优先级最高的用户故事，不能包含登录、用户管理等普遍性的故事。

注意事项

- 在设计本方的迭代计划时，请使用**2轮迭代**：
 - 迭代1：包含了本组第11-14周内开发的用户故事，并详细标识这些用户故事的实际分工和实际开发进度；同时，也应包含本组第15-17周拟开发的用户故事及其分工、开发进度计划（第15-17周是对第11-14周工作结果的优化和完善）。
 - 迭代2：包含了本组第15-17周的计划。

实验报告

■ 遵循模板撰写：

- 项目概述；
- 用户故事清单及各自的卡片(正、反)；
- 用户故事的优先级列表、工作量估算、人员分工；
- 用户故事之间的导航关系。

■ CodeArts其他Scrum项目管理工具：

- Product Planning: 遵照上一步的user story及其信息，加入backlog；
- Sprint/Iteration Planning: 编制2轮sprint的计划，将backlog加入到sprint；
- 各类图表(storyboard、burndown)。

■ MockPlus或其他自选的原型设计工具：

- 原型(UI)设计图形

在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

- <https://www.huaweicloud.com/devcloud/> 注册华为账号

扫码登录

密码登录

华为账号登录


登录

[注册](#) | [忘记密码](#)

使用其他账号登录



[IAM用户](#) | [更多账号登录](#)

我们为您提供华为账号服务，在登录过程中会使用到您的账号和网络信息提升登录体验。 [了解更多](#)

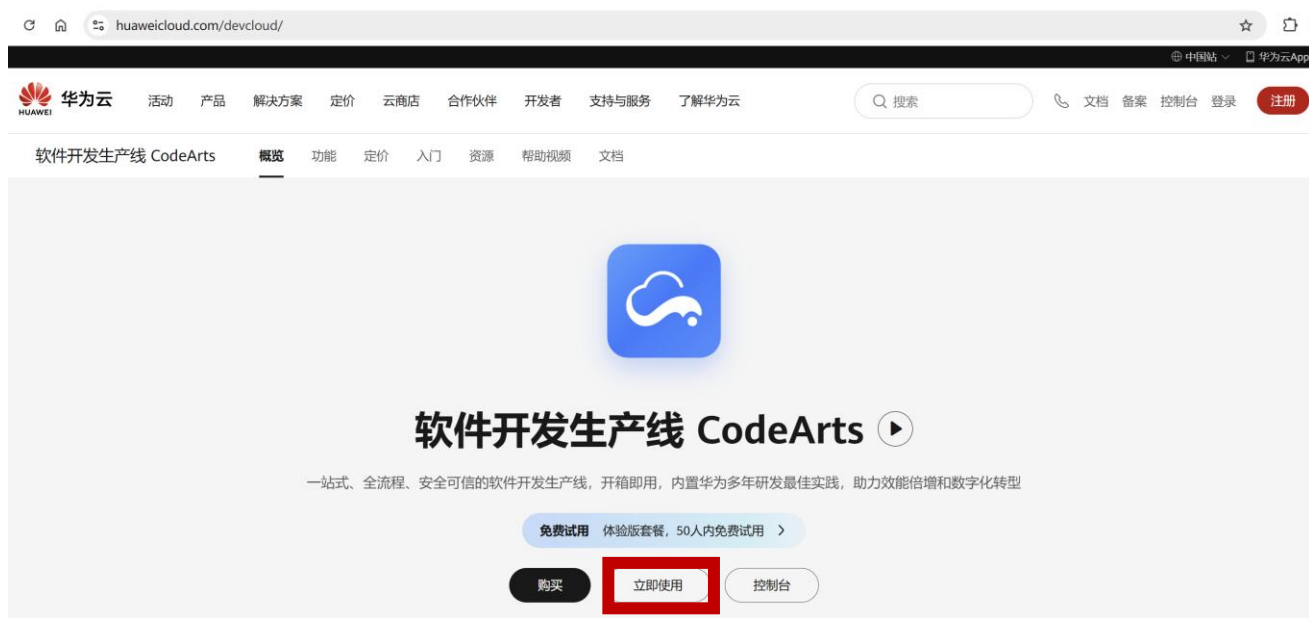


在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

- ❑ 选择新建项目，CodeArts提供一系列项目类型，我们此处选择Scrum；
- ❑ CodeArts提供一些实例项目以供学习，自行学习。

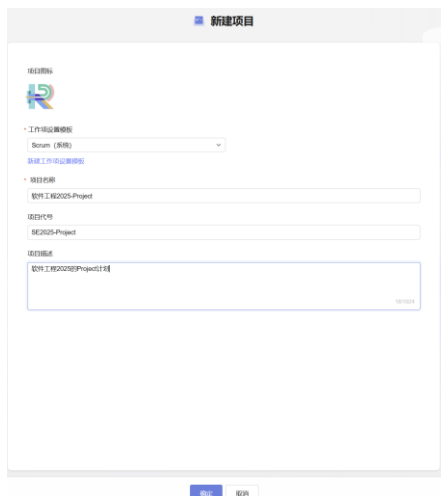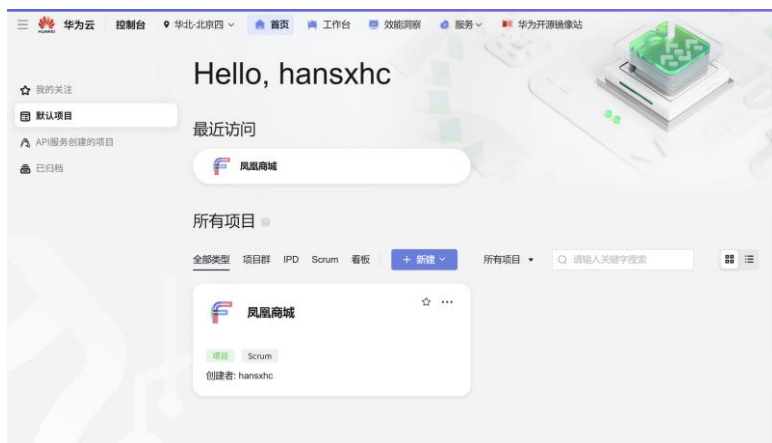

在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

- ❑ 项目新建成功后，进入项目信息看板，左侧导航栏是项目的生命周期，可以按照不同生命周期进行查看。右侧为具体信息。

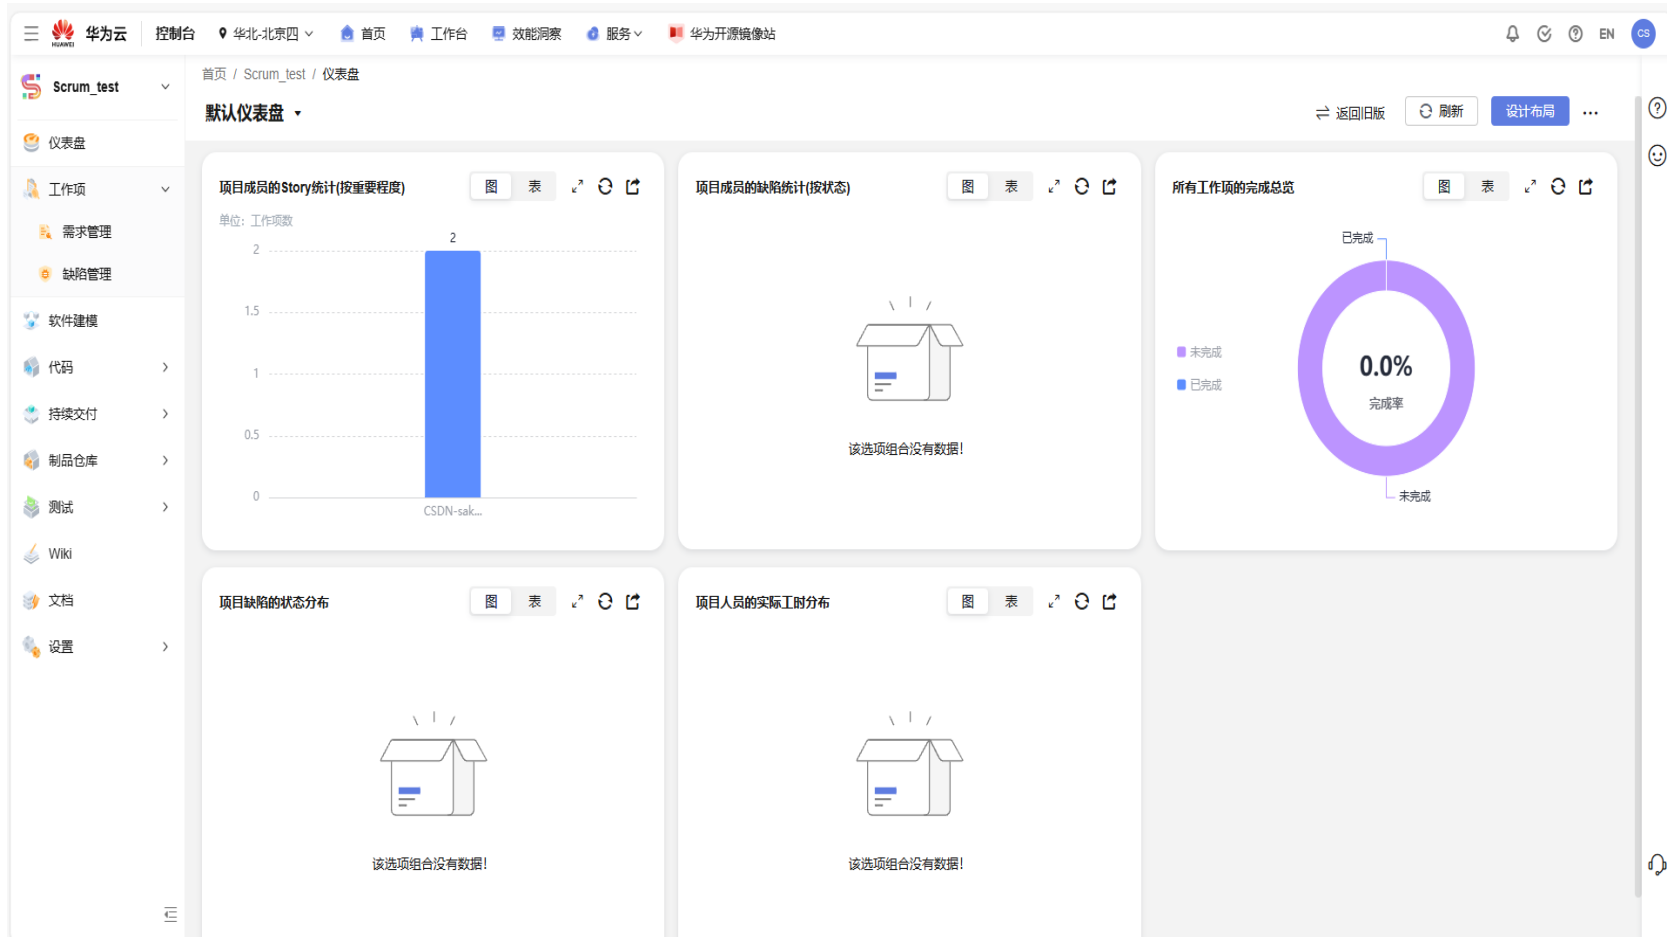

在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

❑ 在设置栏可以管理团队成员和项目组员。包括添加成员、管理成员等。

仪表盘

工作项

需求管理

缺陷管理

软件建模

代码

持续交付

制品仓库

测试

Wiki

文档

设置

通用设置

成员管理

权限管理

工作项设置

代码托管设置

成员视图

成员组

角色视图

待审核 0

添加成员

通过链接邀请

导出成员

用户名称

请输入关键字搜索

用户名称	用户昵称	角色	所属账号	加入时间	操作
ie33834caeb3a288c9d	CSDN-sakara12138	--	CSDN-sakara12138	2025-04-06 21:13:08 GMT+08:00	
ie33834caeb3a288c9d	CSDN-sakara12138	--	CSDN-sakara12138	2025-04-06 21:13:07 GMT+08:00	

从本账号导入用户

从其他项目导入用户

邀请其他账号用户

从委托中导入用户

了解添加成员的差异

ie33834caeb3a288c9d

CSDN-sakara12138

--

项目经理

CSDN-sakara12138

2025-04-06 21:13:08 GMT+08:00

ie33834caeb3a288c9d

CSDN-sakara12138

--



项目管理员

CSDN-sakara12138

2025-04-06 21:13:07 GMT+08:00

在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

□ “工作项” → “需求管理” 中可以创建“迭代”、“Story”等内容

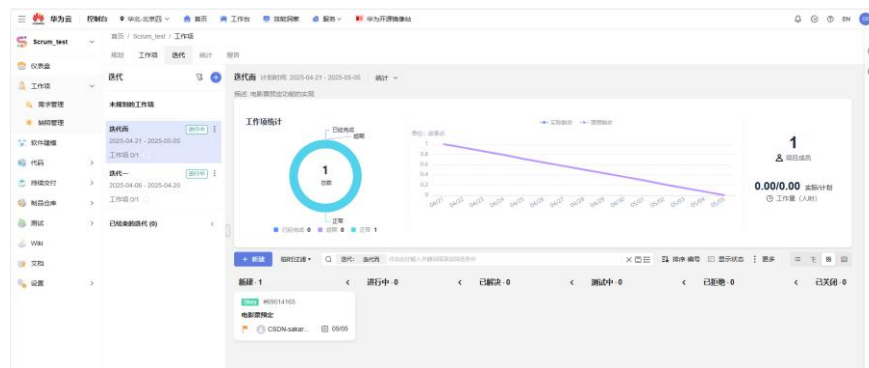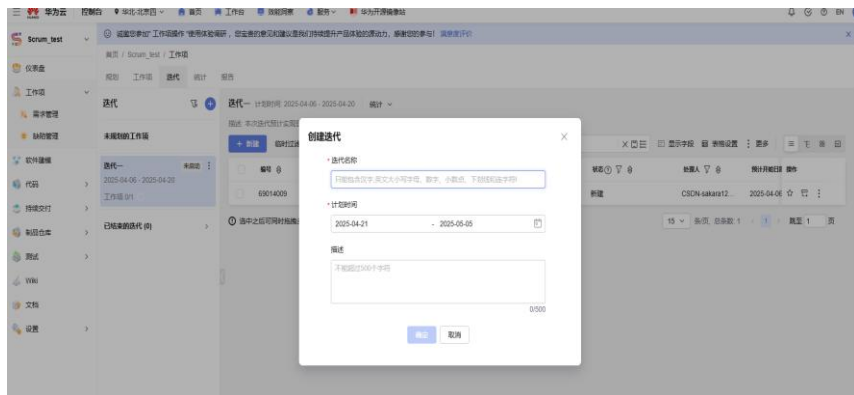

MockPlus

- <https://www.mockplus.cn/>

我的设计利器，团队的协作平台



快速原型设计

海量组件图标，丰富交互动效
用摹客，快速实现创意落地



专业UI设计

矢量编辑、协同设计、资源复用
用摹客，轻松搞定设计创作



高效协同工作

从产品、设计到开发，全流程协作
用摹客，提升团队协作效能



设计规范管理


轻松定制规范，高效管理资源
用摹客，发挥设计资源价值

云端协作，效率倍增

摹客协作，团队的工作平台


产品经理

上传和编辑产品文档 | 制作交互原型 | 清晰梳理产品逻辑 | 设计任务管理



MockPlus

- <https://www.mockplus.cn/>

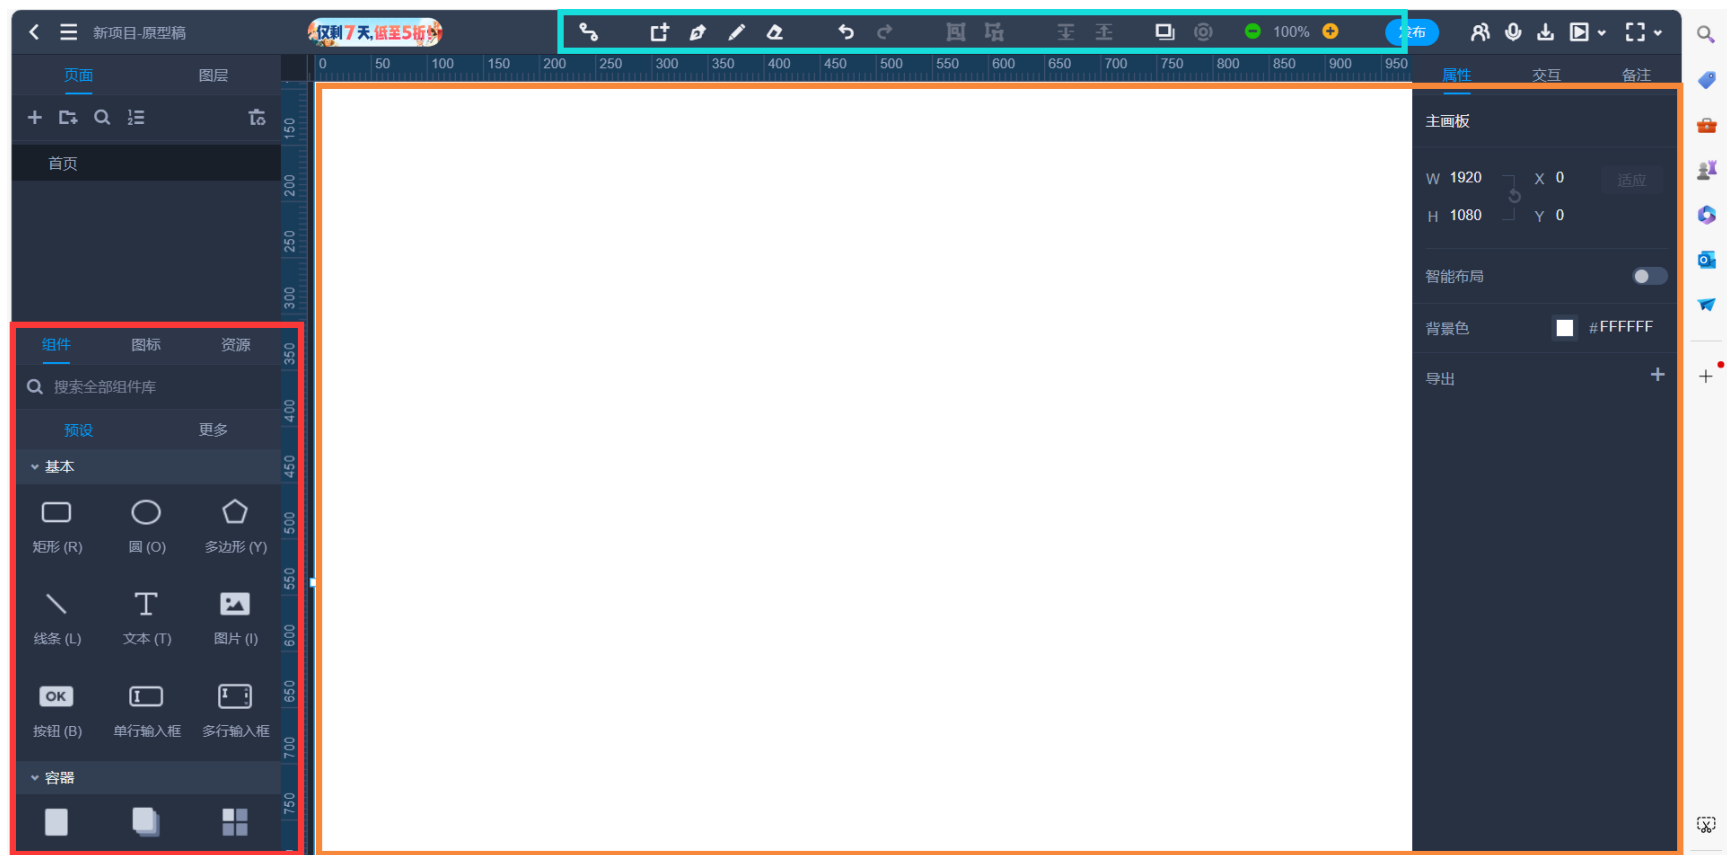

利用大模型生成原型

以下是为车票预订系统界面设计的 DeepSeek 提示词示例，包含功能需求、交互逻辑和视觉风格描述，可直接用于生成原型设计：

提示词示例：高铁/火车票预订界面原型

目标：生成一个简洁高效的移动端车票预订界面原型，包含核心功能流程。

1. 核心功能需求

- 页面层级：
首页 → 车次查询 → 选择车次 → 乘车人选择 → 支付确认
- 关键模块：
 - 出发地/目的地选择（支持城市切换）
 - 日期选择（日历组件，标记有无余票）
 - 车次列表（显示耗时/价格/座位类型）
 - 乘车人管理（常用联系人快捷选择）
 - 订单确认（票价明细+倒计时支付）

2. 交互细节要求

markdown

复制

1. **首页搜索区**

- 双输入框并列布局（出发地/目的地），右侧带「交换」按钮
- 日期选择：默认显示「今天」，下拉展开日历（高亮可选日期）
- 搜索按钮置底（颜色强调，文案为「查询车次」）

2. **车次列表页**

- 卡片式布局，按出发时间排序

元宝

← 车票预订

北京

上海

今天 6月20日 周五

查询车次

元宝

← 选择车次

07:30

2小时15分

09:45

G101 · 复兴号

二等座 ¥553

预订

08:15

2小时30分

10:45

G103 · 和谐号

二等座 ¥498

候补

评判标准

- 对用户故事进行定义和描述的完整性；
- 对用户故事的优先级和工作量估算的准确性；
- 所编制的迭代计划的合理性；
- 原型设计与需求的一致性；
- 对工具CodeArts和MockPlus（或自选工具）的掌握程度；
- 对敏捷开发中的需求管理与项目管理的理解。

提交与检查方式

- 提交日期：第13周周日晚(5月25日 23:55)
- 提交实验报告到头歌平台：
 - 实验报告：命名规则“学号-lab2-report.doc”
- 同组内的三人均要提交，文件命名不同。

- 检查方式：
 - 第14周提交实验报告后，教师和TA对实验报告进行打分。



結束
